


Casa en Dos Valles, Bariloche: Etapa 1 modular

Buscamos cotizar la Etapa 1 de nuestra casa como **producto terminado, llave en mano y sin sorpresas**: una vivienda lista para habitar, con su final de obra, preparada para crecer en una Etapa 2. Abajo están la planta en módulos, lo que necesitamos que incluya y las preguntas que nos ayudan a comparar.

1. Qué pedimos

- **Cotización llave en mano de la Etapa 1** (3 módulos + garage y galería en obra), con todo lo necesario para habitarla.
- Que la Etapa 1 quede **preparada para la Etapa 2** (ver punto 4).
- En la tabla del punto 6, que cada ítem diga si está **incluido, no incluido, u opcional con su precio**.
- Precio desglosado por rubro, moneda, validez de la oferta, plazo y forma de pago.

2. El lote y las reglas del barrio

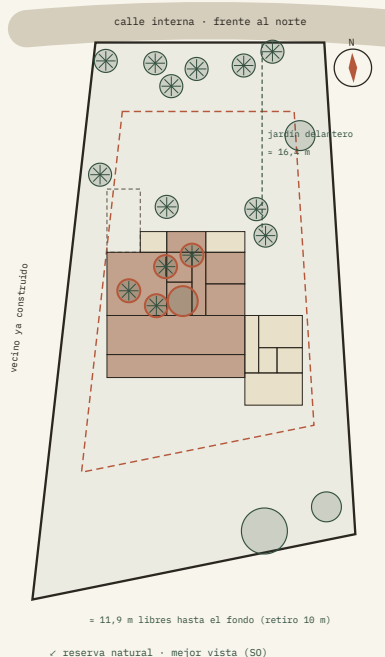


Lote 054 a escala (la barra mide 10 m). Línea roja punteada: retiros obligatorios.

- **Lote:** 054, Dos Valles Club de Campo · 1.083 m² · casi plano · frente al norte (calle), reserva natural al suroeste.
- **Forma:** 20 m de frente, 48,8 y 42,8 m de laterales, 28,7 m de fondo.
- **Retiros:** 6 m al frente, 10 m al fondo, 3 m a cada lado (libres, sin construcción).
- **Superficie mínima:** 130 m² en una planta; los semicubiertos cuentan hasta el 20 %.
- **Techo a dos aguas o más, pendiente mínima de 20°,** con aleros. Altura máxima 8,5 m.
- El garage tiene que ser parte del mismo volumen de la casa (no un volumen aislado).
- **Sistema no tradicional:** necesita aprobación expresa de la Comisión de Arquitectura del barrio. La documentación técnica la armamos en colaboración: el proveedor aporta la del sistema y nuestra arquitecta coordina la presentación.
- **Servicios:** no hay redes listas para conectar. Agua con tanque propio, luz por trámite con la cooperativa eléctrica, gas por trámite con la distribuidora, y cloaca con cámara séptica y lecho nitrificante propios.

3. Etapa 1: planta en módulos

Tres módulos de 3,4 m de ancho (el más largo, de 12 m). El garage y la galería trasera se hacen en obra. Cotas en metros, a escala.

■ Etapa 1 ■ Etapa 2 ■ Límite de módulo ■ Reprogramado en la Etapa 2

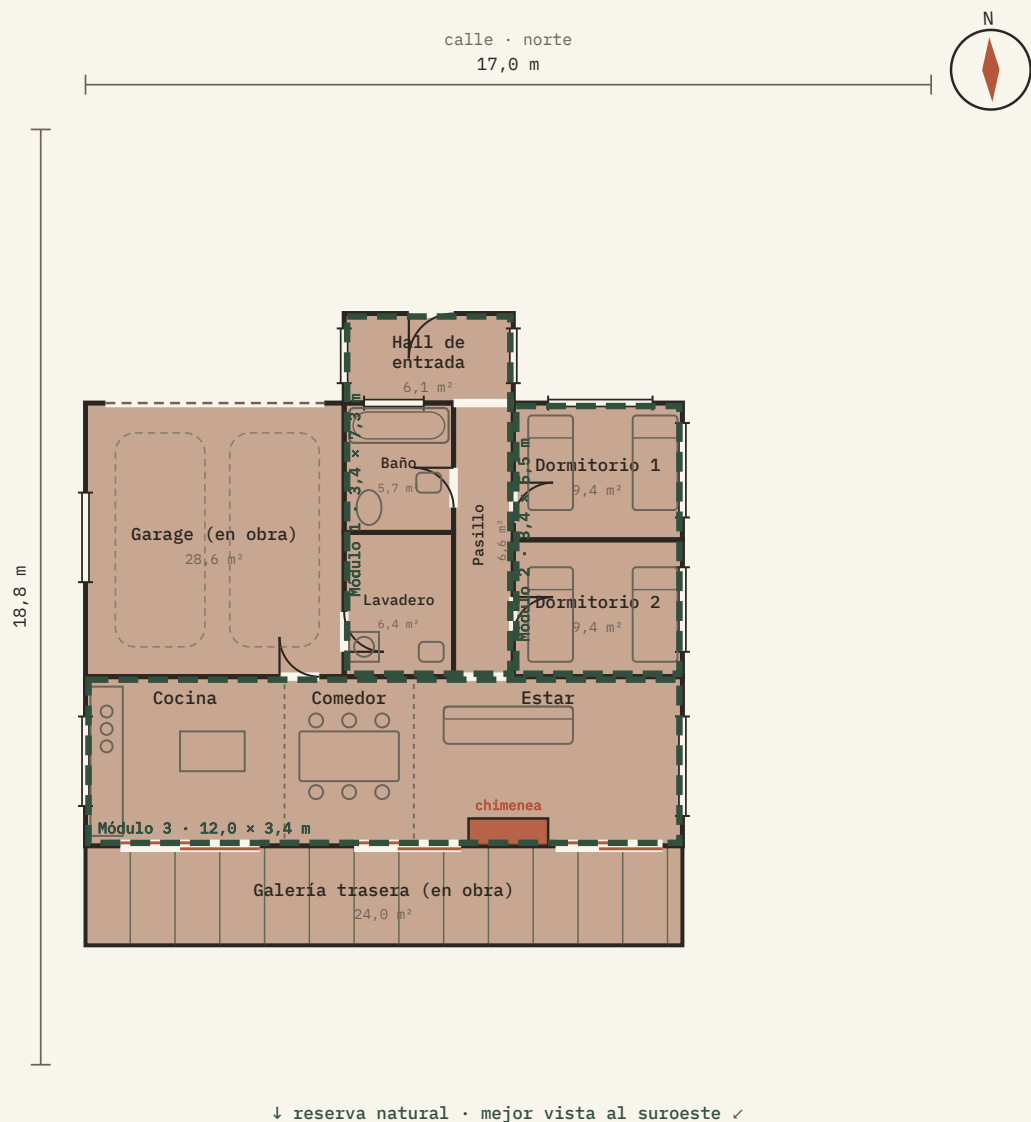

↓ reserva natural · mejor vista al suroeste ✓


Etapa 1: lo que se construye ahora.

ETAPA 1	MEDIDAS	SUPERFICIE
MÓDULOS (FÁBRICA Y TRANSPORTE)		
Módulo 1 · hall · baño · lavadero · pasillo	3,4 × 7,3 m	24,8 m²
Módulo 2 · dos dormitorios	3,4 × 5,5 m	18,7 m²
Módulo 3 · cocina · comedor · estar con chimenea	12,0 × 3,4 m	40,8 m²
Total en módulos		84,3 m²
EN OBRA		
Garage (2 autos, cerrado, terminación simple)	5,2 × 5,5 m	28,6 m²
Galería trasera (semicubierta, de punta a punta)	12,0 × 2,0 m	24,0 m²
Etapa 1 (mínimo del barrio: 130 m²)		136,9 m²

- Baño completo **con bañera**, inodoro y bache. Lavadero con una puerta al garage.
- Cocina, comedor y estar en un solo ambiente, con **chimenea apta para asado** contra el ventanal que mira a la reserva.
- Galería trasera de punta a punta, con corredizas desde el estar.
- Garage cerrado para 2 autos, con ventana al oeste y puerta a la cocina.

4. Etapa 2: para que la Etapa 1 la tenga en cuenta

No se cotiza ahora, pero la Etapa 1 tiene que quedar preparada para recibirla.

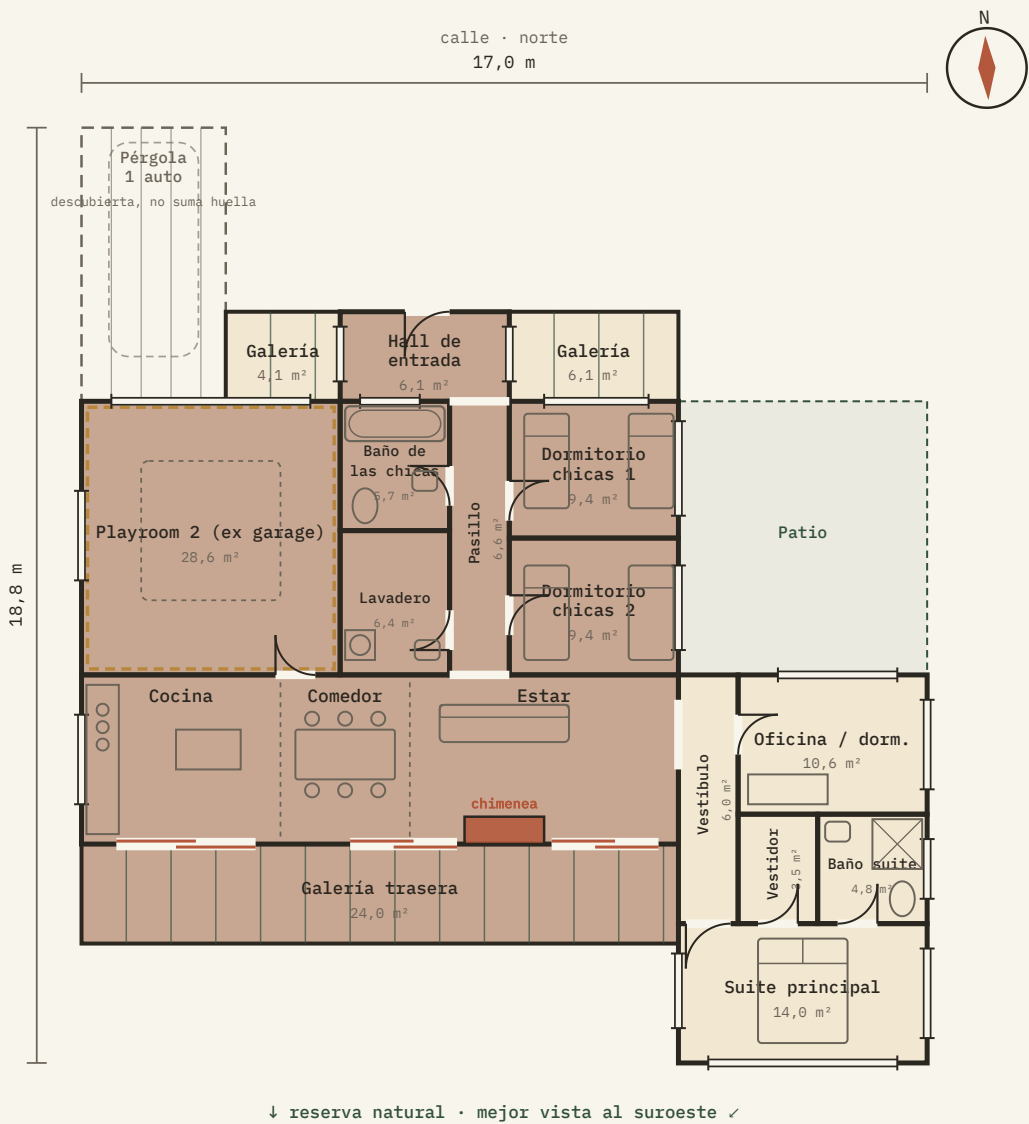

Casa completa: Etapa 1 (oscuro) + Etapa 2 (claro). El garage pasa a ser un playroom y se suma el ala de la suite al sudeste.

ETAPA 2 • SE SUMA DESPUÉS

SUPERFICIE

Vestíbulo

6,0 m²

Oficina / dorm.	10,6 m ²
Vestidor	3,5 m ²
Baño suite	4,8 m ²
Suite principal	14,0 m ²
Galería	4,1 m ²
Galería	6,1 m ²
Garage → playroom 2 (obra interior)	—
Casa completa	186,2 m²

Qué tiene que dejar previsto la Etapa 1:

- En el muro este del Módulo 3 (estar), un vano futuro para unir el ala nueva, con la estructura preparada.
- Tablero eléctrico, potencia, agua caliente y calefacción dimensionados para la casa completa.
- Cámara séptica y lecho nitrificante para la casa completa (o lugar previsto para ampliarlos).
- Cañerías y caños de pase dejados hacia el lado de la Etapa 2.
- Garage con terminación que permita convertirlo en ambiente habitable: aislación o lugar previsto para sumarla.
- Techo pensado para continuar sobre el ala nueva.

5. Calidad mínima que buscamos

- **Aislación térmica, lo más importante.** Doble piso / piso elevado aislado con barrera de vapor; muros y techo con aislación de espesor adecuado para Bariloche; sin puentes térmicos; juntas entre módulos selladas. Indicar materiales, espesores y valores.
- Aberturas con **doble vidrio (DVH)** en toda la casa y marcos de buena prestación térmica.
- Estructura y techo calculados para nieve y viento de la zona.
- Calefacción para toda la casa (proponer sistema) y chimenea apta para asado.
- Terminaciones completas: cocina equipada, baño completo, placares, pisos, revestimientos y pintura.

6. Alcance: qué incluye la cotización

Marcar una opción por fila. Si es opcional, indicar el precio al lado.

ÍTEM	INCLUIDO	NO INCLUIDO	OPCIONAL
Proyecto y documentación			
Proyecto ejecutivo de la vivienda y cálculo estructural	☐	☐	☐
Documentación técnica del sistema para la Comisión de Arquitectura del barrio (en colaboración con nuestra arquitecta)	☐	☐	☐
Planos conforme a obra para el final de obra	☐	☐	☐
Terreno y fundaciones			
Replanteo y movimiento de suelos	☐	☐	☐
Fundaciones / bases para los módulos, el garage y la galería	☐	☐	☐
Módulos			
Fabricación de los 3 módulos	☐	☐	☐
Transporte hasta el lote en Bariloche (indicar costo aparte)	☐	☐	☐
Grúa, montaje y unión entre módulos	☐	☐	☐
Sellado de juntas entre módulos (agua, aire y frío)	☐	☐	☐
Obra en el lugar			
Garage cerrado para 2 autos con portón	☐	☐	☐
Galería trasera semicubierta	☐	☐	☐
Techo a dos aguas continuo sobre módulos, garage y galería	☐	☐	☐
Envolvente y aislación			
Doble piso / piso elevado aislado con barrera de vapor	☐	☐	☐
Aislación de muros y techo (indicar material y espesor)	☐	☐	☐
Aberturas con doble vidrio (DVH) y marcos de buena prestación térmica	☐	☐	☐
Puertas exteriores con aislación	☐	☐	☐
Calefacción y agua caliente			
Sistema de calefacción para toda la casa (losa radiante u otro: indicar cuál)	☐	☐	☐

ÍTEM	INCLUIDO	NO INCLUIDO	OPCIONAL
Chimenea apta para hacer un asado adentro, con su conducto	☐	☐	☐
Termotanque o caldera	☐	☐	☐
Instalación de gas o alternativa eléctrica	☐	☐	☐
Instalaciones y conexiones			
Instalación eléctrica con tablero y puesta a tierra	☐	☐	☐
Conexión a la red eléctrica	☐	☐	☐
Agua: tanque de reserva y bomba	☐	☐	☐
Cámara séptica + lecho nitrificante (dimensionados para la casa completa)	☐	☐	☐
Instalación sanitaria completa	☐	☐	☐
Terminaciones			
Cocina: bajo mesada, alacena, mesada y bacha	☐	☐	☐
Baño completo con bañera, artefactos y grifería	☐	☐	☐
Lavadero equipado	☐	☐	☐
Placares en los dormitorios	☐	☐	☐
Pisos, revestimientos y pintura interior y exterior	☐	☐	☐
Artefactos de iluminación	☐	☐	☐
Final			
Limpieza final de obra	☐	☐	☐
Gestiones para el final de obra	☐	☐	☐
Garantías (indicar qué cubren y por cuánto tiempo)	☐	☐	☐

7. Preguntas

1. ¿Los módulos se fabrican en taller y se transportan, o se construyen en el lote? ¿Qué medidas máximas y qué peso tiene cada módulo?
2. ¿Cuánto cuesta el transporte hasta Bariloche y el montaje con grúa? ¿Hace falta preparar el acceso al lote?
3. ¿Qué sistema de aislación usan en piso, muros y techo? ¿Qué valores térmicos garantizan (transmitancia K o nivel de la norma IRAM 11605)?

4. ¿Cómo resuelven el piso: doble piso, piso elevado, cámara de aire ventilada? ¿Cómo evitan los puentes térmicos y la condensación?
5. ¿Para qué carga de nieve y de viento está calculada la estructura?
6. ¿Qué sistema de calefacción recomiendan para Bariloche y qué consumo estiman?
7. ¿Qué documentación técnica pueden aportar para la aprobación del sistema ante la Comisión de Arquitectura? (La presentación la coordinamos con nuestra arquitecta.)
8. ¿Cómo se deja preparada la Etapa 2: unión con la ala nueva, instalaciones, techo?
9. ¿Cuál es el plazo desde la firma hasta la entrega llave en mano? ¿Pueden pasar un cronograma?
10. ¿Qué garantías dan (estructura, filtraciones, aberturas, instalaciones) y por cuánto tiempo?
11. ¿Qué queda afuera de la cotización? ¿Cuánto cuesta cada opcional?
12. ¿Podemos ver casas que hayan hecho en la zona, o hablar con algún cliente?

Planta esquemática a escala para cotizar: las medidas finales se ajustan con el proyecto ejecutivo. Ante cualquier duda, coordinamos una llamada con nuestra arquitecta.
